

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di VILLASPECIOSA

Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL P.I.P. COMUNALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
VILLASPECIOSA

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

VILLASPECIOSA, lì FEBBRAIO 2011

Il Progettista:
ING. ANDREA MURGIA

ID	Nome	Durata: 120,00 (g)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38		
1	01 - SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE	60g																																								
2	02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI	10g																																								
3	03 - IDRICO	10g																																								
4	04 - FOGNARIO	30g																																								
5	05 - RETI TECNOLOGICHE	10g																																								

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di VILLASPECIOSA

Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL P.I.P. COMUNALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
VILLASPECIOSA

PROGRAMMA DEI LAVORI

VILLASPECIOSA, lì FEBBRAIO 2011

Il Progettista:
ING. ANDREA MURGIA

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	ricavi	da 1 a 61	da 62 a 69	da 70 a 84	da 85 a 98	da 99 a 113	da 114 a 120
01 - SCAVI E MOVIMENTI DI MATERIE	€ 29.677,57	€ 29.677,57					
02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI	€ 36.559,92	€ 3.655,99	€ 29.247,94	€ 3.655,99			
03 - IDRICO	€ 16.551,52			€ 16.551,52			
04 - FOGNARIO	€ 64.658,64			€ 8.621,15	€ 30.174,03	€ 25.863,46	
05 - RETI TECNOLOGICHE	€ 9.435,90					€ 2.830,77	€ 6.605,13
IMPORTO		€ 33.333,56	€ 29.247,94	€ 28.828,66	€ 30.174,03	€ 28.694,23	€ 6.605,13
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 33.333,56	€ 62.581,50	€ 91.410,16	€ 121.584,19	€ 150.278,42	€ 156.883,55
%		21,25	18,64	18,38	19,23	18,29	4,21
% PROGRESSIVA		21,25	39,89	58,27	77,50	95,79	100,00

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di VILLASPECIOSA

Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL P.I.P. COMUNALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
VILLASPECIOSA

PROGRAMMAZIONE S.A.L.

VILLASPECIOSA, lì FEBBRAIO 2011

Il Progettista:
ING. ANDREA MURGIA

PROGRAMMA S.A.L.

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMAT O
	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Inizio lavori
	61	61	€ 33.333,56	€ 33.333,56	21,25	Si
	69	8	€ 62.581,50	€ 29.247,94	39,89	Si
	84	15	€ 91.410,16	€ 28.828,66	58,27	Si
	98	14	€ 121.584,19	€ 30.174,03	77,50	Si
	113	15	€ 150.278,42	€ 28.694,23	95,79	Si
	120	7	€ 156.883,55	€ 6.605,13	100,00	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

PROGETTO ESECUTIVO

Comune di VILLASPECIOSA

Provincia di CAGLIARI


OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL P.I.P. COMUNALE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
VILLASPECIOSA

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

VILLASPECIOSA, lì FEBBRAIO 2011

Il Progettista:
ING. ANDREA MURGIA

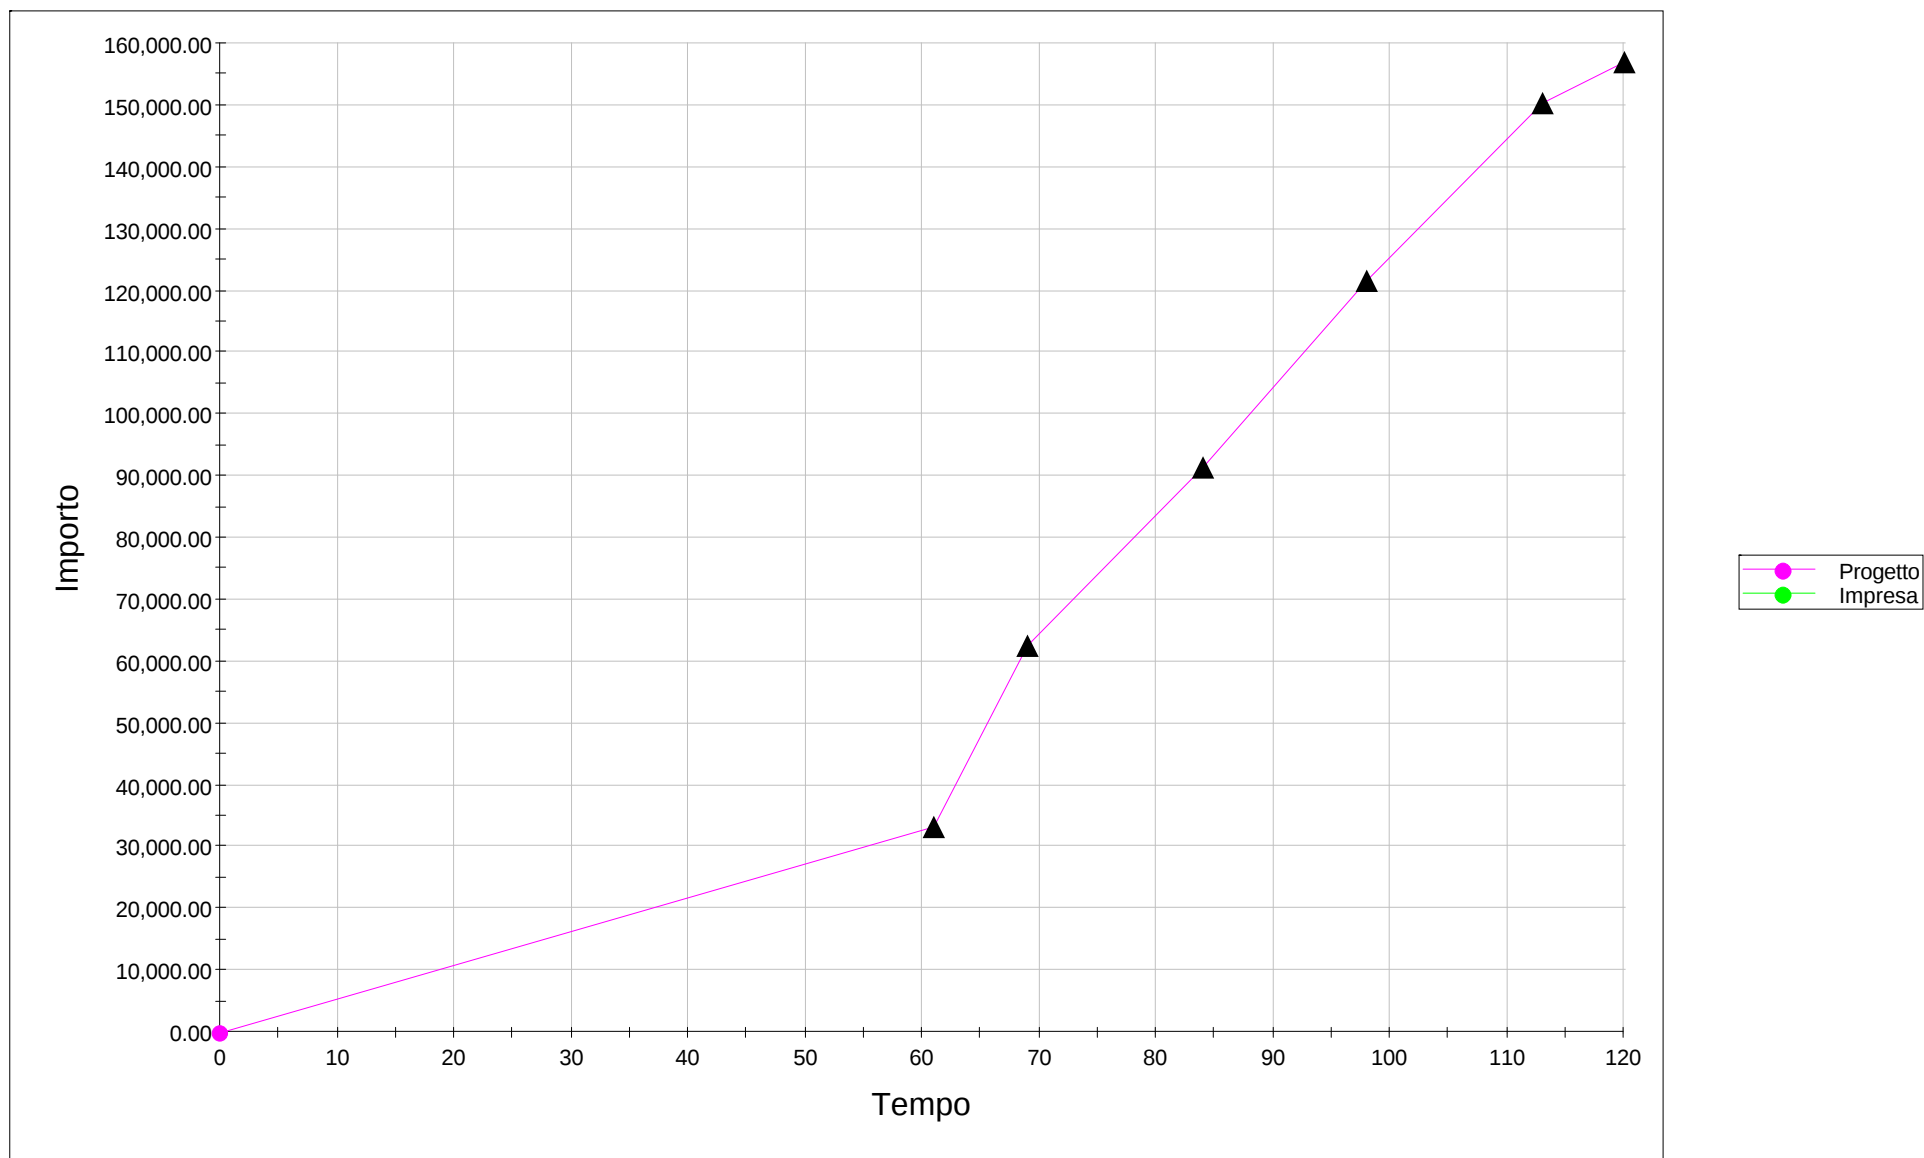

LEGENDA:

- punto che delimita periodi a media di produzione costante
- ▲ Stato Avanzamento Lavori programmato
